Contrôle du dossier — Surélévation Dubois

Dossier de permis, indice B (revérifie l'indice A) · contrôle passé le 09/10/2026
26-018 · 8 rue Francis-de-Pressensé · 69100 Villeurbanne

3 constats ouverts, dont 1 bloquant(s) · 1 décidé(s) · 2 corrigé(s) depuis l'indice A.

Pièces croisées

PC2 · Planche · PC2-plan-de-masse-indA.pdf
PC3 · Planche · PC3-coupe-indA.pdf
PLU-H URm1 · Règlement du PLU · PLU-H-reglement-zone-URm1.pdf
CCTP 02 · CCTP · CCTP-lot-02-gros-oeuvre.pdf
DPGF 02 · DPGF · DPGF-lot-02-gros-oeuvre.pdf
PC5 · Planche · PC5-facades-indB.pdf

---

1. Bloquant · Contre le PLU · Ouvert · relevé depuis l'indice A

Le recul sur limite séparative de « facade est » (3,2 m sur PC2, p. 1) n'atteint pas la règle du PLU (au moins 4 m, article URm1 7).

Correction proposée : Ramener le recul sur limite séparative de « facade est » à au moins 4 m (article URm1 7 du règlement), ou justifier une dérogation.

PC2, p. 1 : « 3,20 m »
Règle : au moins 4 m, article URm1 7 (PLU-H URm1, p. 41)

2. Majeur · Métré et DPGF · Ouvert · relevé depuis l'indice A

Le poste 2.2 est chiffré à 64 m2 à la DPGF (DPGF 02, p. 1) pour 78,4 m2 mesurés (PC2, p. 1 ; PC3, p. 1) : sous-estimé de 18 %.

Correction proposée : Porter la quantité du poste 2.2 à 78,4 m2 à la DPGF, ou justifier l'écart.

PC2, p. 1 : « Dalle haute R+3 : 52,60 m² »
PC3, p. 1 : « Terrasse : 25,80 m² »
DPGF 02, p. 1 : « 2.2 Plancher béton R+3 — m2 — 64,00 »

3. Mineur · CCTP et DPGF · Ouvert · relevé depuis l'indice A

Le poste 2.4 « Isolation thermique par l'extérieur » est décrit au CCTP (CCTP 02, p. 9) mais n'est pas chiffré à la DPGF.

Correction proposée : Ajouter le poste 2.4 à la DPGF, ou le retirer du CCTP.

CCTP 02, p. 9 : « 2.4 Isolation thermique par l'extérieur (ITE) »

4. Mineur · CCTP et DPGF · Écarté · relevé depuis l'indice A

Le poste 2.7 est chiffré à la DPGF (DPGF 02, p. 2) sans description au CCTP.

Correction proposée : Décrire le poste 2.7 au CCTP, ou le retirer de la DPGF.

DPGF 02, p. 2 : « 2.7 Garde-corps terrasse — option — ens 1 »
Motif : Option chiffrée à part, à la demande du maître d'ouvrage. (Vous, le 26/09/2026)

Changements depuis l'indice A


· PC3 · la largeur de « tremie r1 » : de 1,2 m à 1,8 m, p. 1 · non relevé par le contrôle
· PC2 · le recul sur limite séparative : de 3,4 m à 3,2 m, p. 1 · relevé par un constat

---

Corrigés depuis l'indice A

· La hauteur au faîtage diffère d'une pièce à l'autre : 15,6 m sur PC3 (p. 1) ; 16,1 m sur PC5 (p. 1).
· La hauteur au faîtage (16,1 m sur PC5, p. 1) dépasse la règle du PLU (au plus 16 m, article URm1 10).

PC2, page 1 — constats n° 1, 2

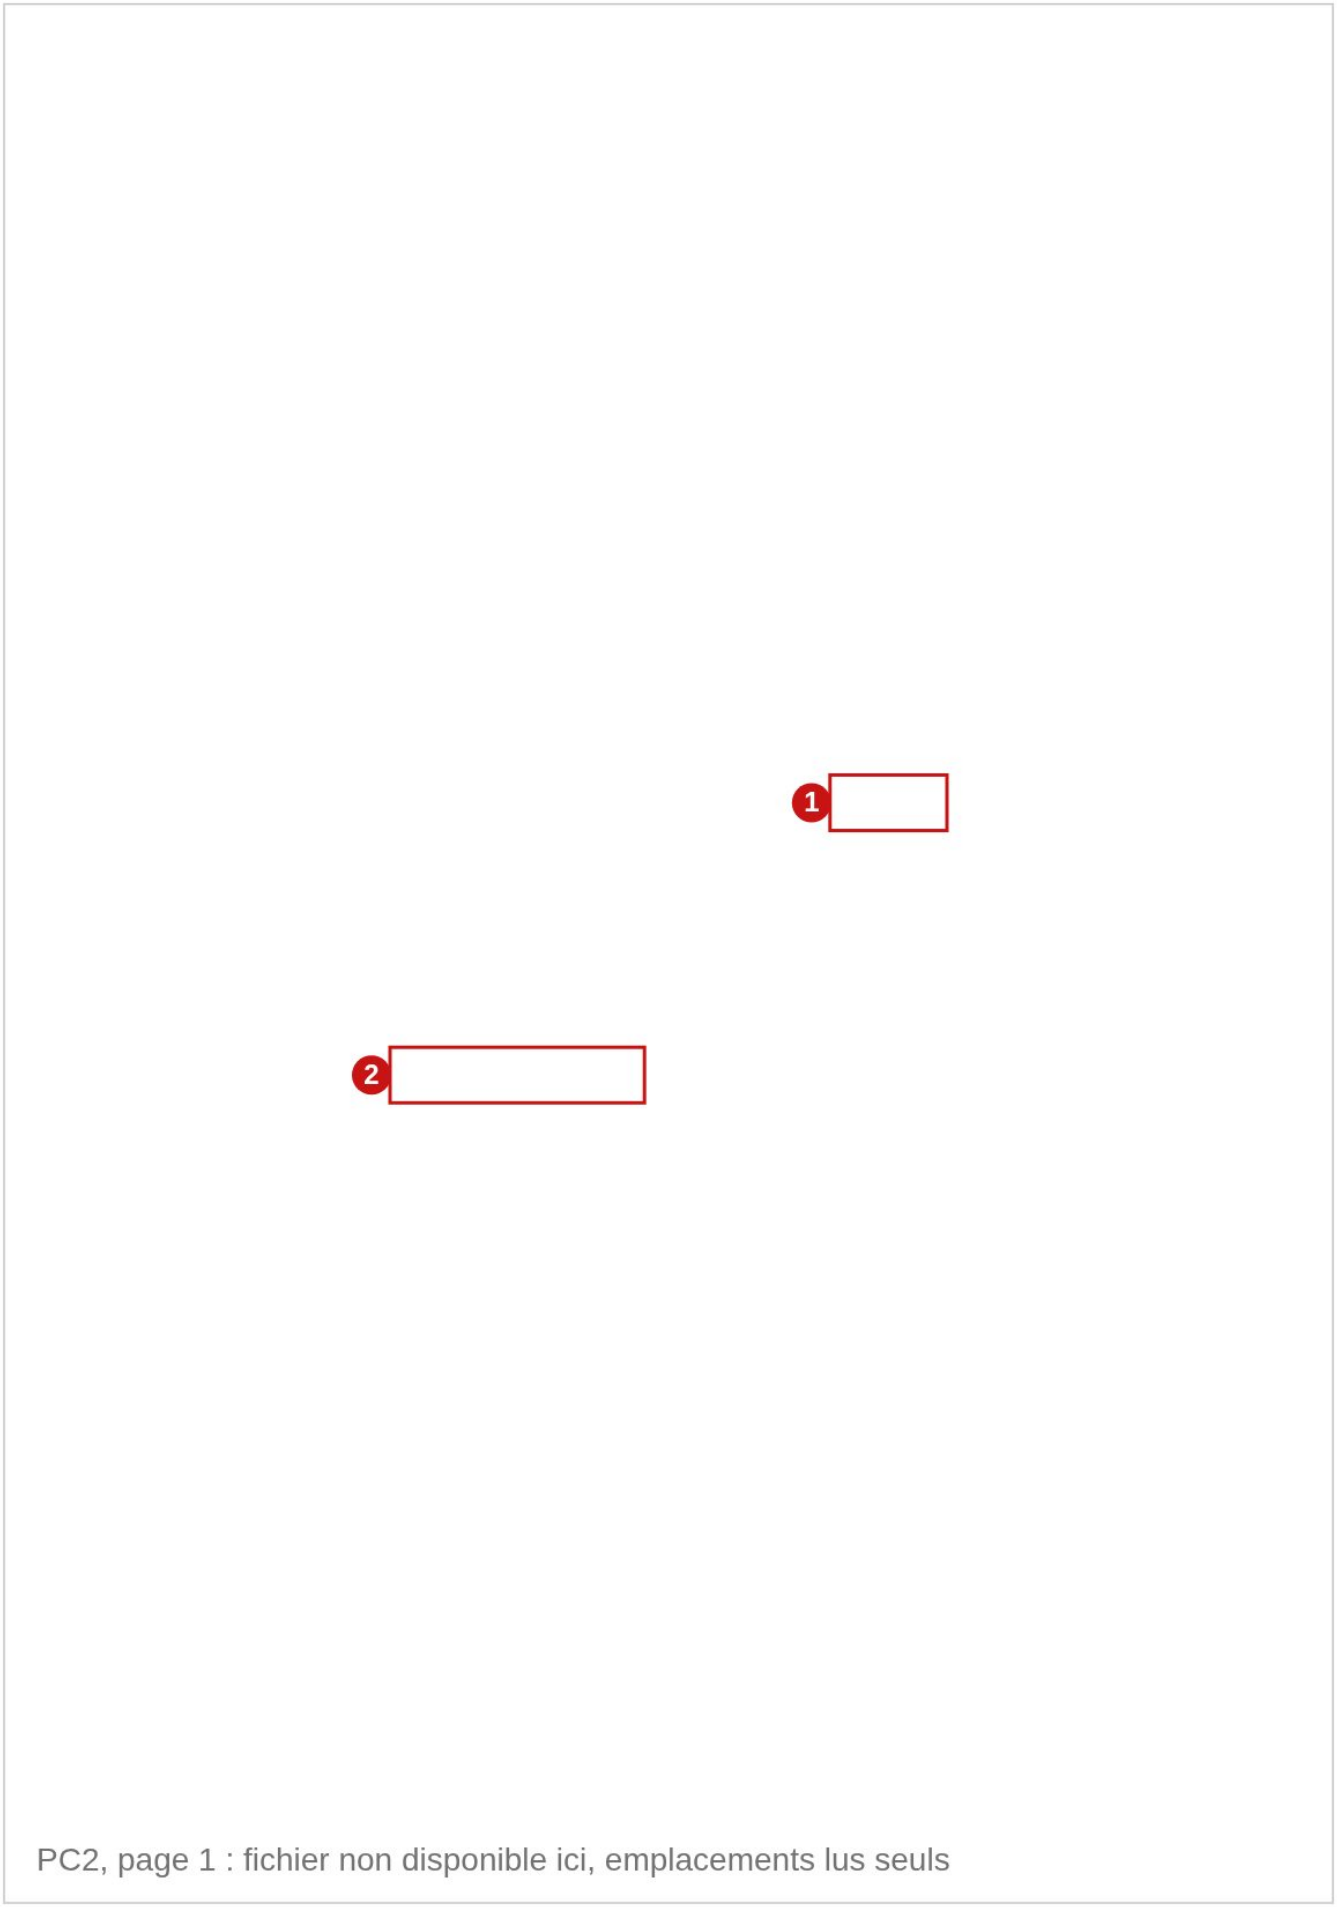


PC3, page 1 — constat n° 2



PC3, page 1 : fichier non disponible ici, emplacements lus seuls

DPGF 02, page 1 — constat n° 2

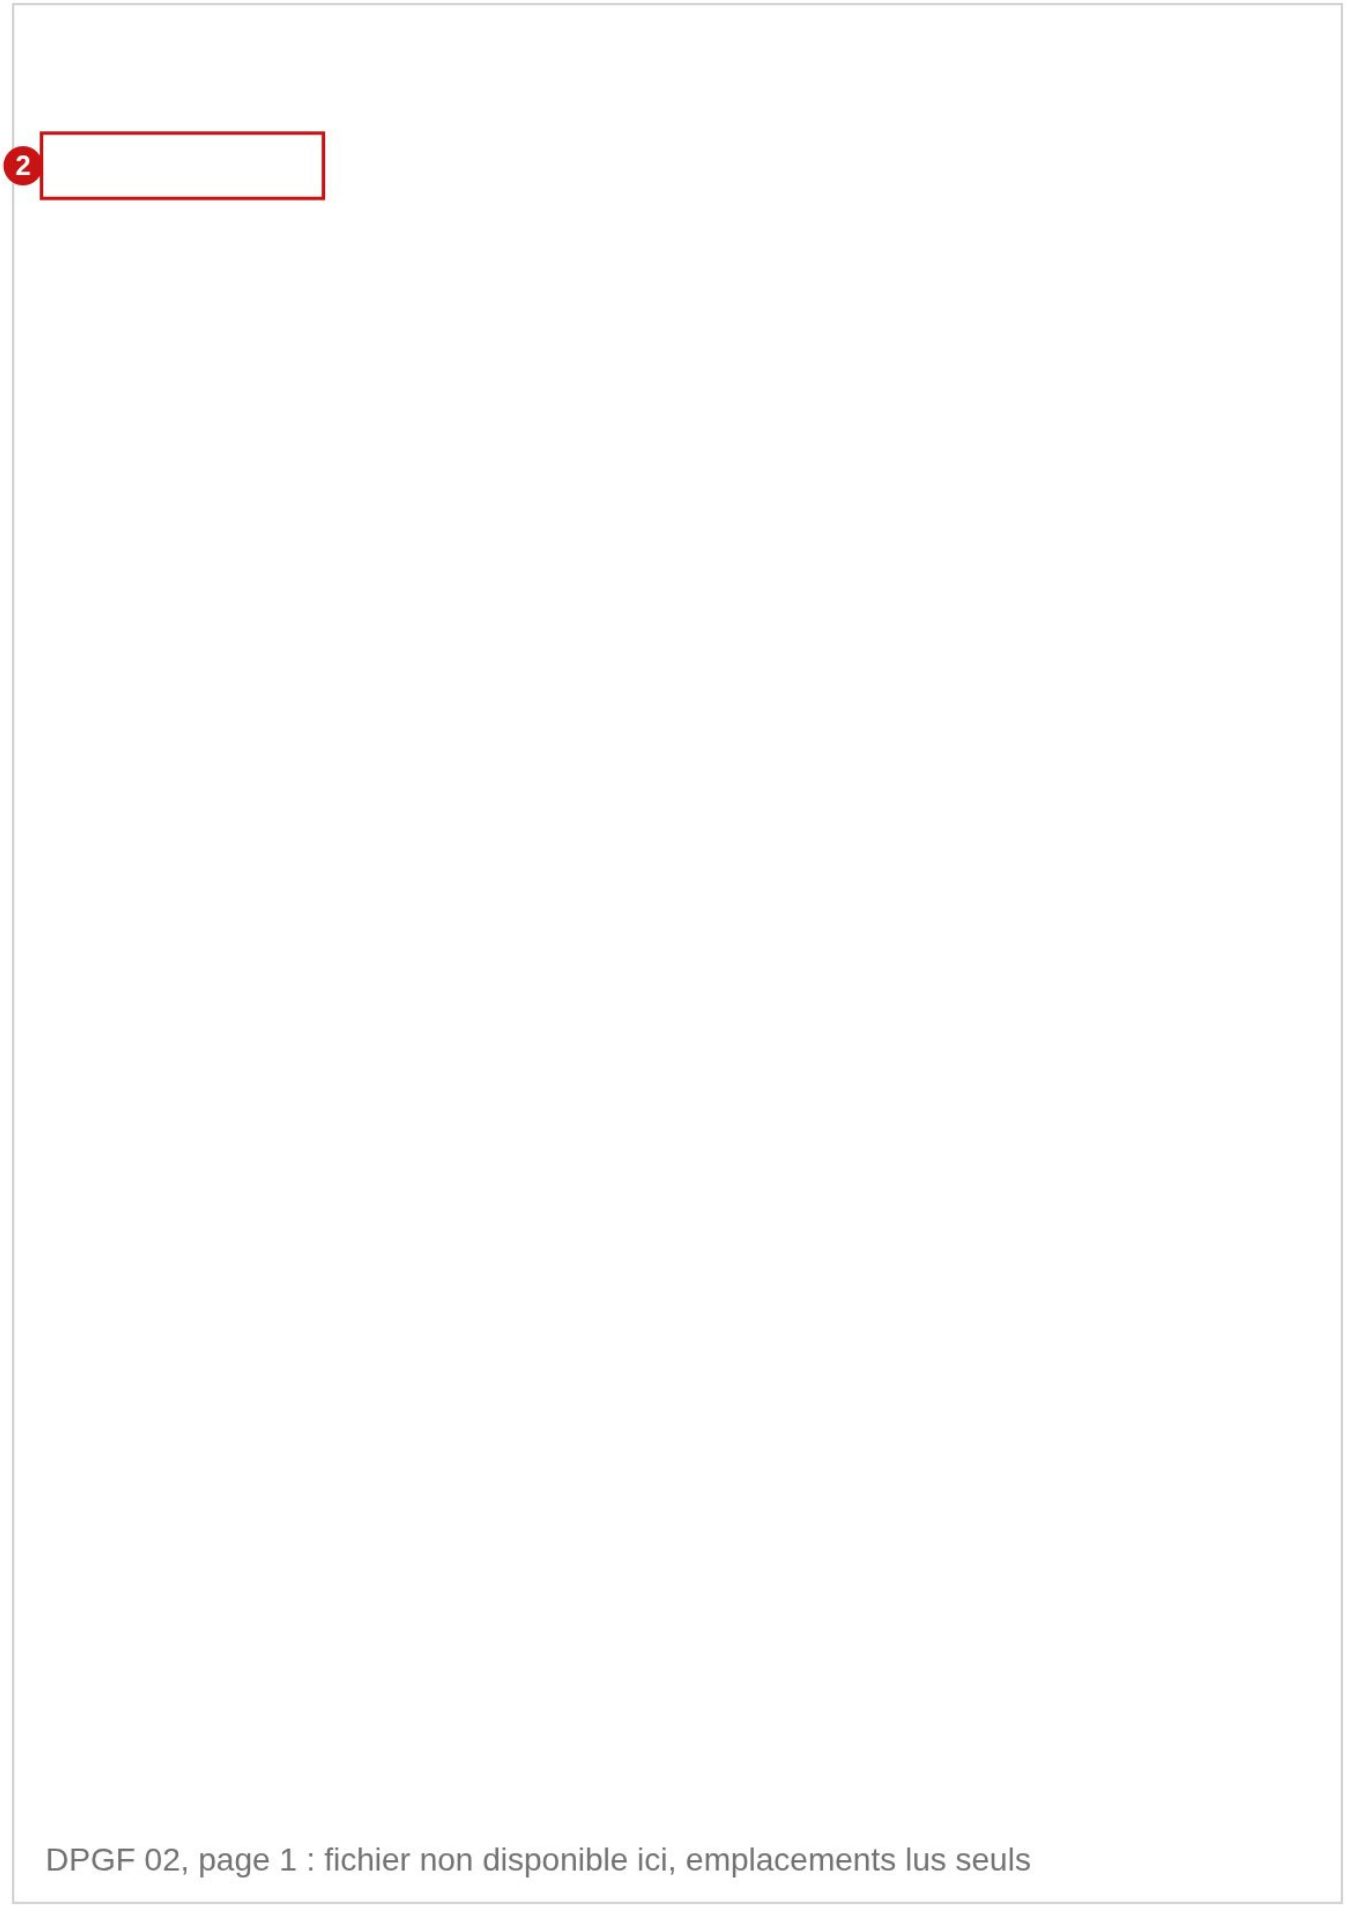



CCTP 02, page 9 : fichier non disponible ici, emplacements lus seuls

DPGF 02, page 2 — constat n° 4

